GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

SEDECO
22 NOV. 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2021

Oficio No. SEDECO/ACD/1312/2021

Lic. María de la Luz Hernández Trejo
Directora General de Desarrollo Económico
Presente

En atención a su oficio número SEDECO/ST/CESP/011/2021 de fecha 18 de noviembre del año en curso, en el que solicita un informe general del estado de avance de la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, para exponerse en la Cuarta Sesión Ordinaria del CESP, se le informa lo siguiente:

Durante el presente año 2021, con recursos por la cantidad de 210 millones de pesos, se benefició a 67 mercados públicos de diez Alcaldías de la Ciudad de México. Meta programada para el presente periodo.

De conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se da a conocer la Acción Institucional y Lineamientos de Operación para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México; dentro de las tres visitas de seguimiento en campo que se tienen para reportar los avances al proyecto de cada uno de los mercados públicos beneficiados y proporcionados por personal de la alcaldía, a la fecha se tiene cumplimentada en un 100% la primera visita; aproximadamente un 94% en la segunda visita y un 17% en la tercera visita. Se anexa gráfica y evidencia fotográfica para pronta referencia.

Por lo que se refiere a que se informe si existen disparidades entre lo programado y la meta real e incluir informe de justificación, se les hace de su conocimiento lo siguiente:

La Alcaldía de Tlalpan mediante el oficio número DGODU/DOOH/0342/2021 de fecha 19 de abril de 2021, firmado por la Arq. Carol Viviam Tejadilla Orozco, Directora de Obras y Operación Hidráulica, y enlace permanente con esta Secretaría de Desarrollo Económico, solicitó la reducción del monto de aportación para el mercado Plaza Mexicana del Sur, manifestando que: *"derivado de que en visitas recientes al Mercado Plaza Mexicana del Sur, se ha detectado que los locatarios, a cuenta propia, han hecho modificaciones en la instalación eléctrica, por lo que en revisión de actividades se encuentra conveniente realizar la reducción al alcance presupuestal, quedando entendido que la misma no afectara la meta establecida"*. Por lo que solicita se giren las indicaciones necesarias a quien corresponda para hacer el ajuste al convenio de colaboración No. DGACD/AIFMMP/040/2021, aprobado en la segunda sesión extraordinaria del CESP. Esto implicó que la aportación de la SEDECO para dicho mercado, que en un inicio era de $1, 200,000.00, se redujera a $1,144,485.00, generando un remanente de $55,515.00.

Toda vez que dicho remanente no fue re direccionado a alguna otra Alcaldía, mediante oficio número SEDECO/ACD/875/2021 se solicitó a la Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas, Lic. Ramona Hernández Morales, fuera devuelto a la Secretaría de Administración y Finanzas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente
Gabriel Leyva Martínez

Director General de Abasto, Comercio y Distribución

C.c.c.e.p. Lic. Fadlala Akabani Hneide. Secretario de Desarrollo Económico. Para su conocimiento.

CG 1037

ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO OE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
Estatus de avance de acuerdo a visitas de seguimiento

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	No. Convenio	Aportación SEDECO	Aportación Alcaldía	Totales	Tipos de trabajos reportados en visitas	Avance reportado por Alcaldía
1	167	Azcapotzalco	Benito Juárez	41	$4,017,199.65	$0.00	$4,017,199.65	Instalación eléctrica	1ra visita 03/09/2021 Avance 20% 2da visita 13/10/21 Avance 62%
2	268	Azcapotzalco	Pantaco	42	$4,017,199.65	$0.00	$4,017,199.65	Instalación eléctrica	1ra visita 03/09/2021 Avance 90% 2da visita 13/10/21 Avance 100%
3	137	Azcapotzalco	Santa Lucía	43	$4,017,199.65	$0.00	$4,017,199.65	Instalación eléctrica	1ra visita 13/10/2021 Avance 15%
4	59	Benito Juarez	La Moderna	44	$15,000,000.00	$10,000,000.00	$25,000,000.00	Demoliciones, cimentacion para techumbre, excavaciones drenaje, Columnas y trabe de fachada principal	1ra visita 13/09/2021 Avance 36%
5	97	Benito Juárez	San Pedro de los Pinos	3	$15,000,000.00	$11,000,000.00	$26,000,000.00	Instalación eléctrica, Instalacion hidrosanitaria, Locales, Pisos, Fachadas, Impermeabilización, Demolición de tanque elevado	1ra visita 02/08/2021 Avance 30% 2da visita 13/09/21 Avance 48%
6	303	Coyoacán	Carmen Serdán	29	$6,000,000.00	$4,000,000.00	$10,000,000.00	Techumbre, Impermeabilización,Cortinas, Instalación eléctrica, Pintura, Pisos	1ra visita 20/07/2021 Avance 30% 2da visita 21/09/2021 Avance 94%
7	157	Coyoacán	XotePIngo	30	$6,000,000.00	$4,000,000.00	$10,000,000.00	Instalación eléctrica,Impermeabilización, Cortinas, Techumbre, Pisos	1ra visita 20/07/2021 Avance 10% 2da visita 21/09/2021 Avance 90%
8	319	Coyoacán	Emiliano Zapata	31	$3,000,000.00	$2,000,000.00	$5,000.000.00	Impermeabilización, Cortinas, Luminarias exteriotes, Rampas, Instalación eléctrica, Techumbre, Pintura	1ra visita 20/07/2021 Avance 10% 2da visita 21/09/2021 Avance 80%
9	123	Gustavo A. Madero	Vicente Guerrero	5	$3,780,000.00	$2,520,000.00	$6,300,000.00	Instalación eléctrica, Drenaje en anden, Impermeabilización	1ra visita 23/08/2021 Avance 13% 2da visita 25/10/2021 Avance 70%
10	45	Gustavo A. Madero	Ran ón Corona	6	$4,800,000.00	$3,200,000.00	$8.000,000.00	Instalación eléctrica, Impermeabilización, Laminas y Canalones	1ra visita 30/08/2021 Avance 18% 2da visita 28/10/2021 Avance 38%
11	116	Gustavo A. Madero	Ampliación Casas Alemán	7	$2,700,000.00	$1,800,000.00	$4,500.000.00	Instalación eléctrica, Impermeabilización, Techumbre cocinas	1ra visita 23/08/2021 Avance 5% 2da visita 25/10/2021 Avance 55%
12	145	Gustavo A. Madero	Panamericana	8	$3.600,000.00	$2,400,000.00	$6,000.000.00	Instalación eléctrica, Impermeabilización, Pisos	1ra visita 30/08/2021 Avance 13% 2da visita 28/10/2021 Avance 70%
13	302	Gustavo A. Madero	25 de Julio	9	$2,700,000.00	$1,800,000.00	$4,500,000.00	Reforzamiento de columnas de techumbre, Techumbre	1ra visita 23/08/2021 Avance 6% 2da visita 25/10/2021 Avance 50%

ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Estatus de avance de acuerdo a visitas de seguimiento

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	No. Convenio	Aportación SEDECO	Aportación Alcaldía	Totales	Tipos de trabajos reportados en visitas	Avance reportado por Alcaldía
14	272	Gustavo A. Madero	Campestre Aragón	10	$2,700,000.00	$1,800,000.00	$4,500,000.00	Instalación eléctrica, Fachada, Sellado de laminas de techumbre	1ra visita 31/08/2021 Avance 18% 2da visita 25/10/2021 Avance 75%
15	218	Gustavo A. Madero	San Juan de Aragón Unidad 2	11	$4,200,000.00	$2,800,000.00	$7,000,000.00	Techumbre, Luminarias, Fachada, Impermeabilización	1ra visita 24/08/2021 Avance 30% 2da visita 26/10/2021 Avance 80%
16	58	Gustavo A. Madero	Gertrudis Sánchez	12	$3,600,000.00	$2,400,000.00	$6,000,000.00	Fachada, Sanitarios, Instalación hidraulica	1ra visita 24/08/2021 Avance 13% 2da visita 26/10/2021 Avance 65%
17	242	Gustavo A. Madero	Pradera	13	$3,000,000.00	$2,000,000.00	$5,000,000.00	Instalación eléctrica, Fachada	1ra visita 23/08/2021 Avance 13% 2da visita 27/10/2021 Avance 45%
18	56	Gustavo A. Madero	10 de mayo	14	$7,800,000.00	$5,200,000.00	$13,000,000.00	Instalación eléctrica, Fachada	1ra visita 24/08/2021 Avance 4% 2da visita 26/10/2021 Avance 30%
19	161	Gustavo A. Madero	Bondojito	15	$5,100,000.00	$3,400,000.00	$8,500,000.00	Instalación eléctrica, Fachada	1ra visita 24/08/2021 Avance 8% 2da visita 26/10/2021 Avance 30%
20	339	Gustavo A. Madero	San Juan de Aragón Unidad 6	16	$5,100,000.00	$3,400,000.00	$8,500,000.00	Instalación eléctrica, Fachada, Impermeabilización	1ra visita 31/08/2021 Avance 8% 2da visita 27/10/2021 Avance 68%
21	336	Gustavo A. Madero	San Juan de Aragón Unidad 4 y 5	17	$5,100,000.00	$3,400,000.00	$8,500,000.00	Instalación eléctrica, Fachada	1ra visita 26/08/2021 Avance 16% 2da visita 05/11/2021 Avance 62%
22	366-1	Gustavo A. Madero	Lindavista Vallejo Patera	18	$7,800,000.00	$5,200,000.00	$13,000,000.00	Instalación eléctrica, Fachada	1ra visita 30/08/2021 Avance 5% 2da visita 28/10/2021 Avance 40%
23	204	Gustavo A. Madero	San Juan de Aragón Unidad 7	19	$6,000,000.00	$4,000,000.00	$10,000,000.00	Instalación eléctrica, Fachada, Impermeabilización	1ra visita 31/08/2021 Avance 10% 2da visita 27/10/2021 Avance 40%
24	338	Gustavo A. Madero	Cuchilla de Tesoro	20	$3,000,000.00	$2,000,000.00	$5,000,000.00	Instalación eléctrica, Fachada	1ra visita 26/08/2021 Avance 5% 2da visita 05/11/2021 Avance 65%
25	219	Gustavo A. Madero	San Juan de Aragón Unidad 3	21	$2,100,000.00	$1,400,000.00	$3,500,000.00	Instalación eléctrica	1ra visita 26/08/2021 Avance 6% 2da visita 05/11/2021 Avance 80%

ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Estatus de avance de acuerdo a visitas de seguimiento

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	No. Convenio	Aportación SEDECO	Aportación Alcaldía	Totales	Tipos de trabajos reportados en visitas	Avance reportado por Alcaldía
26	164	Gustavo A. Madero	Santa Rosa	22	$2,100,000.00	$1,400,000.00	$3,500,000.00	Instalación eléctrica	1ra visita 02/09/2021 Avance 10% 2da visita 28/10/2021 Avance 65%
27	176	Gustavo A. Madero	Santa María Ticomán	23	$2,100,000.00	$1,400,000.00	$3,500,000.00	Instalación eléctrica	1ra visita 01/09/2021 Avance 12% 2da visita 03/10/2021 Avance 70%
28	405	Gustavo A. Madero	Cuautepec	24	$2,100,000.00	$1,400.000.00	$3,500,000.00	Instalación eléctrica	1ra visita 01/09/2021 Avance 12% 2da visita 03/10/2021 Avance 70%
29	337	Gustavo A. Madero	Chalma de Guadalupe	47	$4,017,199.65	$0.00	$4,017,199.65	Drenaje de bajadas de agua pluvial, Cortinas, Protecciones	1ra visita 01/09/2021 Avance 4% 2da visita 03/10/2021 Avance 70%
30	255	Iztacalco	El Rodeo	32	$555,408.00	$370,272.00	$925,680.00	Instalación eléctrica	1ra visita 04/08/2021 Avance 35% 2da visita 20/09/2021 Avance 91%
31	334	Iztacalco	Ejidos de la Magdalena Mixhuca	33	$791,352.00	$527,568.00	$1,318,920.00	Instalación eléctrica	1ra visita 04/08/2021 Avance 35% 2da visita 20/09/2021 Avance 95%
32	331	Iztacalco	Río Frío	34	$6,024,441.40	$4,016,294.27	$10,040,735.67	Sistema contra Incendios	1ra visita 14/09/2021 Avance 52%
33	332	Iztacalco	Leona Vicario	35	$15,000,000.00	$11,085,865.73	$26,085,865.73	Locales, Instalación eléctrica, Instalación hidrosanitaria, Reforzamientos, Acabados	1ra visita 20/09/2021 Avance 52%
34	333	Iztapalapa	Cananea	4	$5,000.000.00	$0.00	$5.000.000.00	Techumbre, Luminatias de pasillos	1ra visita 12/08/2021 Avance 14% 2da visita 29/09/2021 Avance 64%
35	243	Iztapalapa	Constituyentes de 1917	48	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Luminarias, Reguistros en pasillos, Reforzamiento de trabe dañada	1ra visita 12/08/2021 Avance 0% 2da visita 29/09/2021 Avance 100%
36	186	Iztapalapa	Culhuacán	49	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Rehabilitacion en sanitarios	1ra visita 10/08/2021 Avance 0% 2da visita 24/09/2021 Avance 95%
37	131	Iztapalapa	Escuadrón 201	50	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Rehabilitacion en sanitarios, Drenaje	1ra visita 10/08/2021 Avance 0% 2da visita 24/09/2021 Avance 90%

ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Estatus de avance de acuerdo a visitas de seguimiento

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	No. Convenio	Aportación SEDECO	Aportación Alcaldía	Totales	Tipos de trabajos reportados en visitas	Avance reportado por Alcaldía
38	291	Iztapalapa	Francisco Villa	51	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Rehabilitacion en sanitarios, Drenaje en cocinas	1ra visita 21/07/2021 Avance 15% 2da visita 19/08/2021 Avance 70% 3ra visita 06/10/2021 Avance 95%
39	239	Iztapalapa	Guadalupe del Moral	52	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Rehabilitacion en sanitarios	1ra visita 11/08/2021 Avance 0% 2da visita 27/09/2021 Avance 20%
40	39	Iztapalapa	Iztapalapa	53	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Reforzamiento de muro de fachada, Pintura	1ra visita 22/07/2021 Avance 2% 2da visita 18/08/2021 Avance 80% 3ra visita 05/10/2021 Avance 95%
41	294	Iztapalapa	Jacarandas	54	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Instalación eléctrica (alimentación de locales)	1ra visita 23/07/2021 Avance 35% 2da visita 13/08/2021 Avance 75% 3ra visita 04/10/2021 Avance 100%
42	230	Iztapalapa	Juan de la Barrera	55	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Instalación eléctrica (alimentación de locales)	1ra visita 12/08/2021 Avance 32% 2da visita 29/09/2021 Avance 100%
43	213	Iztapalapa	La Purísima	56	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Instalación eléctrica (alimentación de locales cocinas)	1ra visita 22/07/2021 Avance 35% 2da visita 18/08/2021 Avance 98% 3ra visita 05/10/2021 Avance 100%
44	129	Iztapalapa	Progreso del Sur	57	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Pintura interior y fachadas	1ra visita 22/07/2021 Avance 45% 2da visita 19/08/2021 Avance 95% 3ra visita 05/10/2021 Avance 100%
45	120	Iztapalapa	San Andrés Tetepilco	58	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Instalación eléctrica (alimentacion de interruptor principal, identificación de circuitos, balanceo de cargas)	1ra visita 09/08/2021 Avance 40% 2da visita 23/09/2021 Avance 98%
46	246	Iztapalapa	San José Aculco	59	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Red de drenaje de pasillo central y conexión a red principal	1ra visita 21/07/2021 Avance 12% 2da visita 20/08/2021 Avance 87% 3ra visita 07/10/2021 Avance 100%

ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Estatus de avance de acuerdo a visitas de seguimiento

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	No. Convenio	Aportación SEDECO	Aportación Alcaldía	Totales	Tipos de trabajos reportados en visitas	Avance reportado por Alcaldía
47	191	Iztapalapa	San Juanico	60	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Rehabilitacion en sanitarios y bombas	1ra visita 09/08/2021 Avance 0% 2da visita 23/09/2021 Avance 75%
48	226	Iztapalapa	San Lorenzo Tezonco	61	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Rehabilitacion en sanitarios	1ra visita 11/08/2021 Avance 0% 2da visita 27/09/2021 Avance 0%
49	208	Iztapalapa	San Lorenzo Xicoténcatl	62	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Rehabilitacion en sanitarios, Drenaje en área de cocinas	1ra visita 21/07/2021 Avance 2% 2da visita 19/08/2021 Avance 55% 3ra visita 06/10/2021 Avance 85%
50	200	Iztapalapa	Santa Cruz Meyehualco	63	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Rehabilitacion en sanitarios, Lamina de techumbre de cocinas	1ra visita 23/07/2021 Avance 4% 2da visita 13/08/2021 Avance 88% 3ra visita 04/10/2021 Avance 100%
51	63	Iztapalapa	Santa María Aztahuacan	64	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Rehabilitacion en sanitarios, Tanque de hidroneumatico, Impermeabilizante en área de cocinas	1ra visita 23/07/2021 Avance 4% 2da visita 13/08/2021 Avance 86% 3ra visita 04/10/2021 Avance 100%
52	128	Iztapalapa	Sector Popular	65	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Impermeabilización	1ra visita 21/07/2021 Avance 7% 2da visita 20/08/2021 Avance 95% 3ra visita 07/10/2021 Avance 100%
53	223	Iztapalapa	Sifón	66	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Instalación eléctrica (luminarias)	1ra visita 09/08/2021 Avance 0% 2da visita 23/09/2021 Avance 75%
54	316	Iztapalapa	Veinticuatro de Febrero	67	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	Instalación eléctrica (luminarias), Rahabilitación en sanitarios	1ra visita 11/08/2021 Avance 0% 2da visita 27/09/2021 Avance 22%
55	384	Magdalena Contreras	La Cruz	25	$750,000.00	$500,000.00	$1,250,000.00	Portón en acceso area de planta de emergencia, CCTV, Gabinetes de extintores, Letras en fachada con giros	1ra visita 06/08/2021 Avance 70% 2da visita 12/10/2021 Avance 95%
56	383	Magdalena Contreras	Cerro del Judio	26	$930,000.00	$620,000.00	$1,550,000.00	Pisos en cocinsa, pasillo y escaleras, Luminarias de locales y fachada, Sellado de extractores y limpieza de canalones	1ra visita 06/08/2021 Avance 65% 2da visita 12/10/2021 Avance 95%

ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Estatus de avance de acuerdo a visitas de seguimiento

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	No. Convenio	Aportación SEDECO	Aportación Alcaldía	Totales	Tipos de trabajos reportados en visitas	Avance reportado por Alcaldía
57	170	Magdalena Contreras	Turístico Magdalena	27	$1,860,000.00	$1,240,000.00	$3,100,000.00	Pisos, Pintura de estructura, Base para mural	1ra visita 06/08/2021 Avance 45% 2da visita 12/10/2021 Avance 100%
58	132	Magdalena Contreras	La Loma	28	$960,000.00	$640,000.00	$1,600,000.00	Rehabilitación en sanitarios, CCTV, Techumbre de área de carga y descarga	1ra visita 06/08/2021 Avance 70% 2da visita 12/10/2021 Avance 99%
59	248	Tláhuac	Santa Cecilia	1	$2,100,000.00	$1,400,000.00	$3,500,000.00	Demoliciones en área d carga y descarga, Construcción de barras, Instalación eléctrica, Entortados, Pintura en estructura de locales	1ra visita 07/07/2021 Avance 8% 2da visita 22/09/2021 Avance 70% 3ra visita 08/11/2021 Avance 87%
60	179	Tláhuac	San Juan Ixtayopan	2	$9,900,000.00	$6,600,000.00	$16,500,000.00	Levantamiento de muros e instalación hidrosanitaria en baños y administración, Columnas en fachada principal	1ra visita 07/07/2021 Avance 10% 2da visita 22/09/2021 Avance 25% 3ra visita 08/11/2021 Avance 45%
61	267	Tlalpan	Fuentes Brotantes	38	$3,300,000.00	$2,200,000.00	$5,500,000.00	Instalación eléctrica, Malla perimetral rejacero	1ra visita 05/08/2021 Avance 25% 2da visita 28/09/2021 Avance 50%
62	263	Tlalpan	Villa Coapa	39	$3,300,000.00	$2,200,000.00	$5,500,000.00	Instalación eléctrica (soportería y ductería)	1ra visita 05/08/2021 Avance 2% 2da visita 28/09/2021 Avance 65%
63	392	Tlalpan	Plaza Mexicana del Sur	40	$1,144,485.00	$762,990.00	$1,907,475.00	Instalación eléctrica (caja derivadora, soportería y ductería)	1ra visita 05/08/2021 Avance 15% 2da visita 28/09/2021 Avance 90%
64	286	Tlalpan	Flores San Fernando	45	$1,380,000.00	$920,000.00	$2,300,000.00	Instalación eléctrica, Cortinas de locales	1ra visita 05/08/2021 Avance 5% 2da visita 28/09/2021 Avance 55%
65	44	Xochimilco	Xochimilco Zona (Xochitl)	36	$2,400,000.00	$1,600,000.00	$4,000,000.00	Instalación eléctrica	1ra visita 10/09/2021 Avance 40% 2da visita 20/10/2021 Avance 81%
66	377	Xochimilco	Xochimilco Anexo	37	$6,600,000.00	$4,400,000.00	$11,000,000.00	Instalación eléctrica	1ra visita 10/09/2021 Avance 35% 2da visita 20/10/2021 Avance 65%
67	190	Xochimilco	San Gregorio	46	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00	Cortinas de locales	1ra visita 10/09/2021 Avance 100% 2da visita 20/10/2021 Avance 100%
				TOTALES	**$209,944,485.00**	**$123,002,990.00**	**$332,947,475.00**		

ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Estatus de avance de acuerdo a visitas de seguimiento

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	No. Convenio	Aportación SEDECO	Aportación Alcaldía	Totales	Tipos de trabajos reportados en visitas	Avance reportado por Alcaldía

*Con el oficio número SEDECO/ACD/875/2021 se envía el formato denominado "Adecuaciones Presupuestarias" con la justificación solicitada en el oficio SEDECO/DEAF/1078/2021, por la Lic. Ramona Hernández Morales, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas:
JUSTIFICACIÓN. Mediante oficio número DGODU/DOOH/0342/2021 de fecha 19 de abril de 2021, firmado por la Arq. Carol Viviam Tejadilla Orozco, Directora de Obras y Operación Hidráulica, y enlace permanente con esta Secretaría de Desarrollo Económico, solicita la reducción del monto de aportación para el mercado Plaza Mexicana del Sur de la Alcaldía Tlalpan, manifestando la Alcaldía que: "derivado de que en visitas recientes al Mercado Plaza Mexicana del Sur, se ha detectado que los locatarios, a cuenta propia, han hecho modificaciones en la instalación eléctrica, por lo que en revisión de actividades se encuentra conveniente realizar la reducción al alcance presupuestal, quedando entendido que la misma no afectara la meta establecida."; por lo que solicita se giren las indicaciones necesarias a quien corresponda para hacer el ajuste al convenio de colaboración No. DGACD/AIFMMP/040/2021, aprobado en la segunda sesión extraordinaria del CESP. Esto implicó que la aportación de SEDECO para dicho mercado, que en un inicio era de $1,200,000.00 se redujera a $1,144,485.00, generando un remanente de $55,515.00. Dicho remanente no va a ser redireccionado a alguna otra Alcaldía por lo que solicitamos que sea devuelto a la Secretaría de Administración y Finanzas.

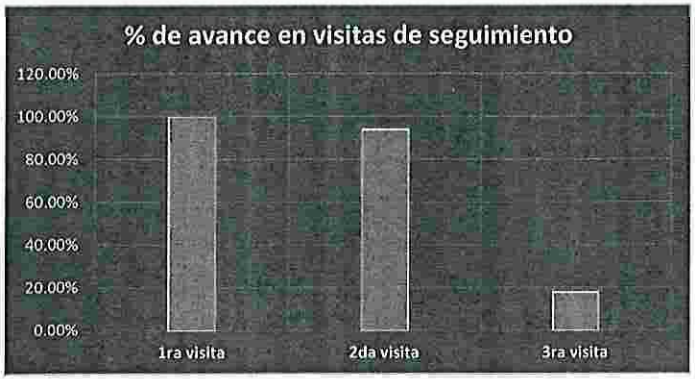

Mercado público Pantaco, Alcaldía Azcapotzalco (Antes y Después)

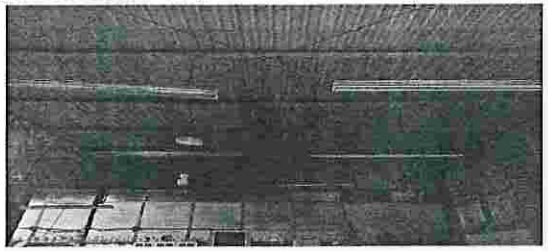
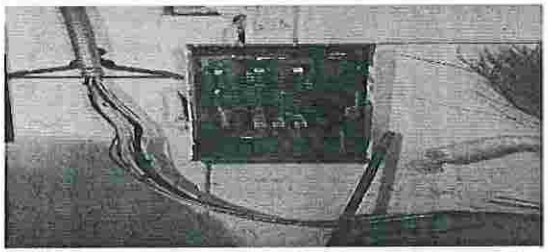

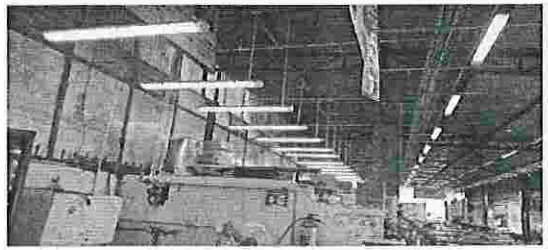
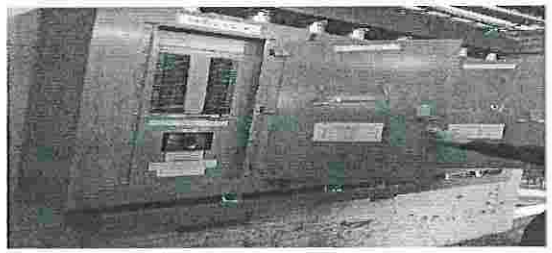

ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Estatus de avance de acuerdo a visitas de seguimiento

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	No. Convenio	Aportación SEDECO	Aportación Alcaldía	Totales	Tipos de trabajos reportados en visitas	Avance reportado por Alcaldía

Mercado público Constituyentes de 1917, Alcaldía Iztapalapa (Antes y Después)




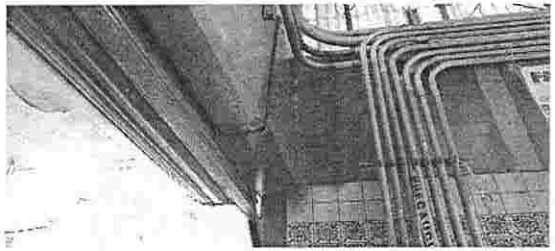

Mercado público Santa Cruz Meyehualco, Alcaldía Iztapalapa (Antes y Después)



ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021

Estatus de avance de acuerdo a visitas de seguimiento

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	No. Convenio	Aportación SEDECO	Aportación Alcaldía	Totales	Tipos de trabajos reportados en visitas	Avance reportado por Alcaldía

Mercado público Turístico Magdalena, Alcaldía Magdalena Contreras (Antes y Después)

Mercado público San Gregorio, Alcaldía Xochimilco (Antes y Después)
